

کد مدرک: CM۱۱۰ شماره و تاریخ بازنگری: ۰۱/۰۸/۲۹-۰۰ شماره صفحه: ۳ از ۱	دستورالعمل بررسی لایحه تاخیرات پروژه	 شهرداری بندرعباس
--	---	---

تهیه کنندگان			تایید کنندگان		تصویب کننده
مسئول نظارت فنی	سرپرست اداره پروژه های عمرانی	رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری	سرپرست مدیریت نوسازی و تحول اداری	معاون امور زیربنایی	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مریم نقطه	محمد امین پورحیدری	سعید قائمی	علیرضا مدرس	حسین یازماندگان	محمد رضا کهوری
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:

فهرست اصلاحیه های صادره

شماره بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره صفحه اصلاح شده	شرح اصلاحیه

وضعیت کنترل

نام و نام خانوادگی: آزاده رنجبر	مستول امور بهبود روشها	معتبر	منسوخ	بازنگری سالانه
تاریخ و امضاء:				

هرگونه ایجاد، بازنگری، ویرایش و یا تغییر در محتوا، قالب و شکل دستورالعمل، منوط به بررسی تخصصی و تأیید مدیریت نوسازی و تحول اداری می باشد.

کد مدرک: CM۱۱۰	دستورالعمل بررسی لایحه تاخیرات پروژه	 شهررداری بندرعباس
شماره و تاریخ بازنگری: ۰۱/۰۸/۲۹-۰۰		
شماره صفحه: ۳ از ۲		

۱- هدف و دامنه کاربرد

هدف از این دستورالعمل ایجاد وحدت رویه بین پروژه ها در بررسی فرآیند رسیدگی لایحه تاخیرات و شناسایی عوامل ایجاد تاخیر در اجرای پروژه ها می باشد.
دامنه کاربرد این دستورالعمل شامل شهرداری بندرعباس، مناطق و سازمانهای تابعه می باشد.

۲- مسئولیتها و اختیارات

مسئولیت اجرای بهینه این روش با رئیس سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری می باشد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن با معاون امور زیربنایی می باشد.
مسئولیت تغییر و به روز آوری با پیشنهاد تهیه کنندگان این دستورالعمل و تایید معاون امور زیربنایی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و تصویب شهردار می باشد.

۳- تعاریف



- لایحه: مستنداتی از کلیه علل تاخیر رخ داده در طول عمر پروژه که به ادعای پیمانکار خارج از قصور او بوده و در پیشرفت عملیات اجرایی مطابق با برنامه زمان بندی تاخیر ایجاد کرده است.

۴- مراجع

- شرایط عمومی پیمان

- شرایط خصوصی پیمان

۵- شرح فعالیتها (روند عملیات)

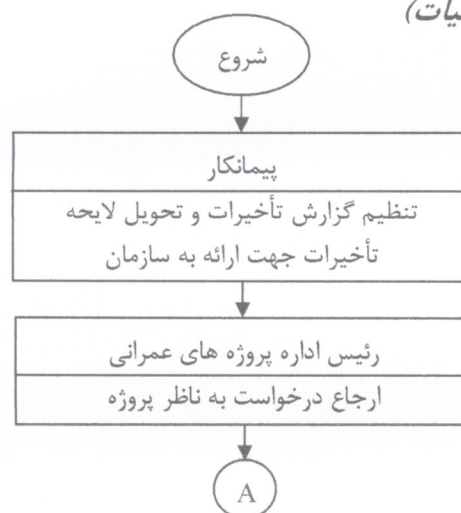

تایید کنندگان		تهیه کنندگان				
تصویب کننده	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	معاون امور زیربنایی	مدیر نوسازی و تحول اداری	رئیس سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری	سرپرست اداره پروژه های عمرانی	مسئول نظارت فنی
شهردار بندرعباس	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:

کد مدرک: FM117	صورتجلسه لایحه تاخیرات پروژه های عمرانی	 شهرداری بندرعباس
شماره و تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۰۹/۱۴-۰۰		
شماره صفحه: ۱ از ۱		

بدینوسیله براساس درخواست شرکت به شماره قرارداد
به شماره قرارداد مورخ موضوع قرارداد

مبنی بر تمدید مدت پیمان فوق و همچنین در اجرای ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان و شرح دلایل ذیل:

- ۱-
- ۲-
- ۳-

بررسی و برای مدت ماه از تاریخ جهت تمدید پروژه مزبور موافقت می گردد.

ناظر پروژه	رئیس اداره پروژه های عمرانی	رئیس سازمان عمران
نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:
